

## 平成26年度 特定事業の進捗状況

## 【土崎駅周辺地区】

	実施主体	実施箇所	実施内容	実施時期			進捗状況	備考
				短期 (~H25)	中期 (~H27)	長期 (~H32)		
道 路	国	①-1国道7号 (県道土崎停車場線交差点~市道秋田港線交差点)	歩道拡幅、歩道の段差解消 消融雪設備等	■			完 成	平成22年度
	秋田県	②-2県道土崎停車場線 (市道土崎本線交差点~国道7号交差点)	歩道の段差解消 消融雪設備等	■			完 成	平成23年度
	秋田市	③市道浜ナシ山港北線 (国道7号交差点~市道土崎西四丁目中谷地線交差点)	点字ブロックの設置	■			完 成	平成22年度
		④市道土崎西四丁目中谷地線 (北部市民サービスセンター前~市道土崎西三丁目1号線交差点)	点字ブロックの設置	■			完 成	平成22年度
交通 安全	公安委員会	国道7号と市道浜ナシ山港北線との交差点	音響式信号機改良	■			完 成	平成25年度
		市道浜ナシ山港北線と市道土崎西四丁目中谷地線との交差点	音響式信号機改良	■			完 成	平成25年度


## 【新屋駅周辺地区】

	実施主体	実施箇所	実施内容	実施時期			進捗状況	備考
				短期 (~H25)	中期 (~H27)	長期 (~H32)		
道 路	秋田県	①県道秋田天王線 (市道新屋扇町洪谷町線交差点~市道新屋浜田線交差点)	段差解消等	■	■		実施中	進捗率:約74%(前年度63%)
	秋田市	②-1市道新屋扇町洪谷町線 (秋田勤労者体育センター西部体育館前~市道新屋浜田線丁字路交差点)	歩道新設	■			完 成	平成24年度

## 【市立病院・山王官公庁周辺地区】


	実施主体	実施箇所	実施内容	実施時期			進捗状況	備考
				短期 (~H25)	中期 (~H27)	長期 (~H32)		
道 路	秋田県	①-2県道秋田天王線 (県道秋田停車場線交差点~市道川尻広面線丁字路交差点)	段差解消 消融雪設備等	■	■		完 成	平成25年度
		②市道川尻広面線 (県道秋田天王線十字路交差点~市道川尻広面線交差点)	段差解消等	■	■		完 成	平成26年度
	秋田市	③-2市道川尻八橋線 (市道山王西線交差点~市道川尻広面線交差点)	段差解消等	■	■		未着手	平成27年度実施予定
		③-3市道川尻八橋線 (市道川尻広面線交差点~市道川尻総社神社通り線交差点)	破損点字ブロックの交換	■	■	■	未着手	平成27~29年度 段差解消工事と合わせて実施予定
		⑦市道川元山下町1号線 (市道川尻広面線交差点~市道川元開和町1号線丁字路交差点)	点字ブロックの設置	■	■		実施中	進捗率:約37%(前年度37%)
都市 公園	秋田市	山王第一街区公園	園路、広場、トイレ整備	■			完 成	平成25年度
		山王官公庁緑地	園路整備	■			完 成	平成25年度
交通 安全	公安委員会	秋田県社会福祉会館前交差点	エスコートゾーン設置	■			完 成	平成23年度
		秋田県警察本部前交差点	音響式信号機改良	■			完 成	平成23年度

## 特定事業の進捗状況【土崎駅周辺地区】

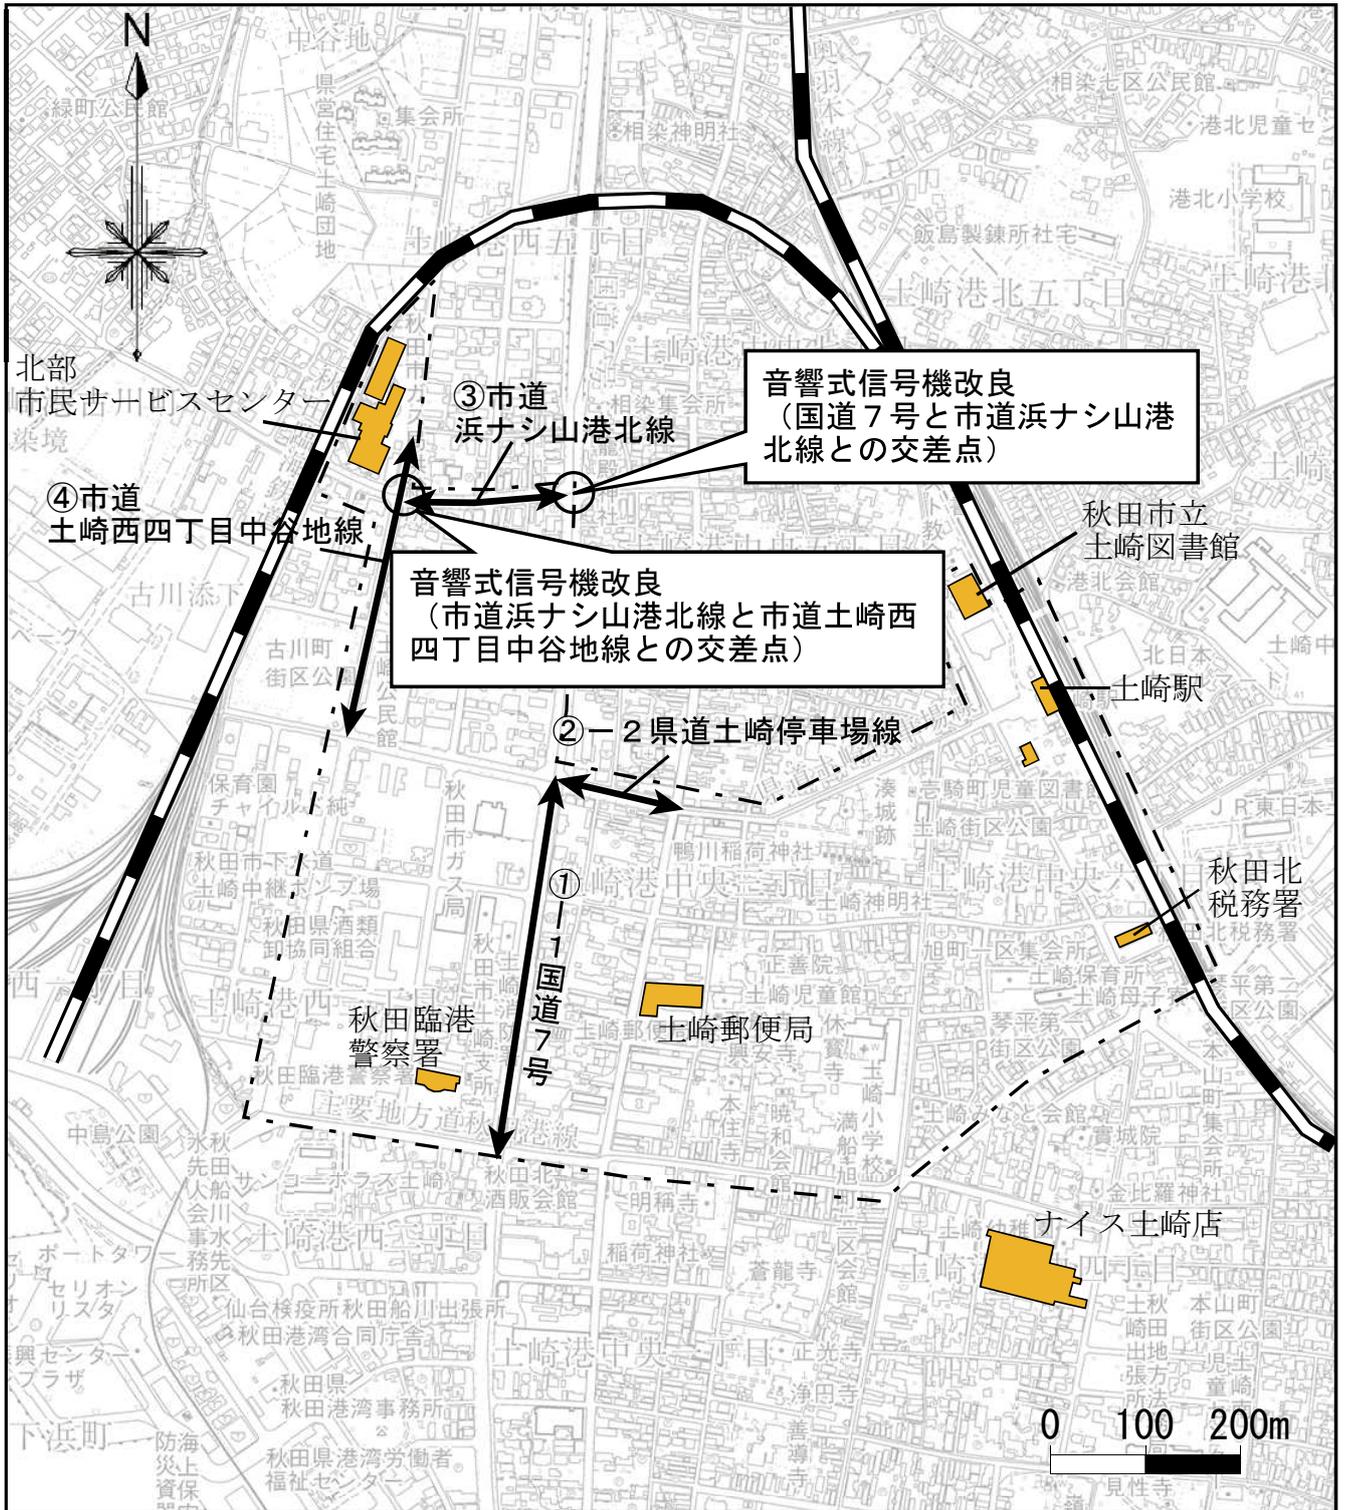


凡 例		重点整備地区	
	平成 26 年度 完 成		継 続 中
	平成 25 年度 以 前 完 成		未 着 手

# 特定事業の進捗状況【新屋駅周辺地区】

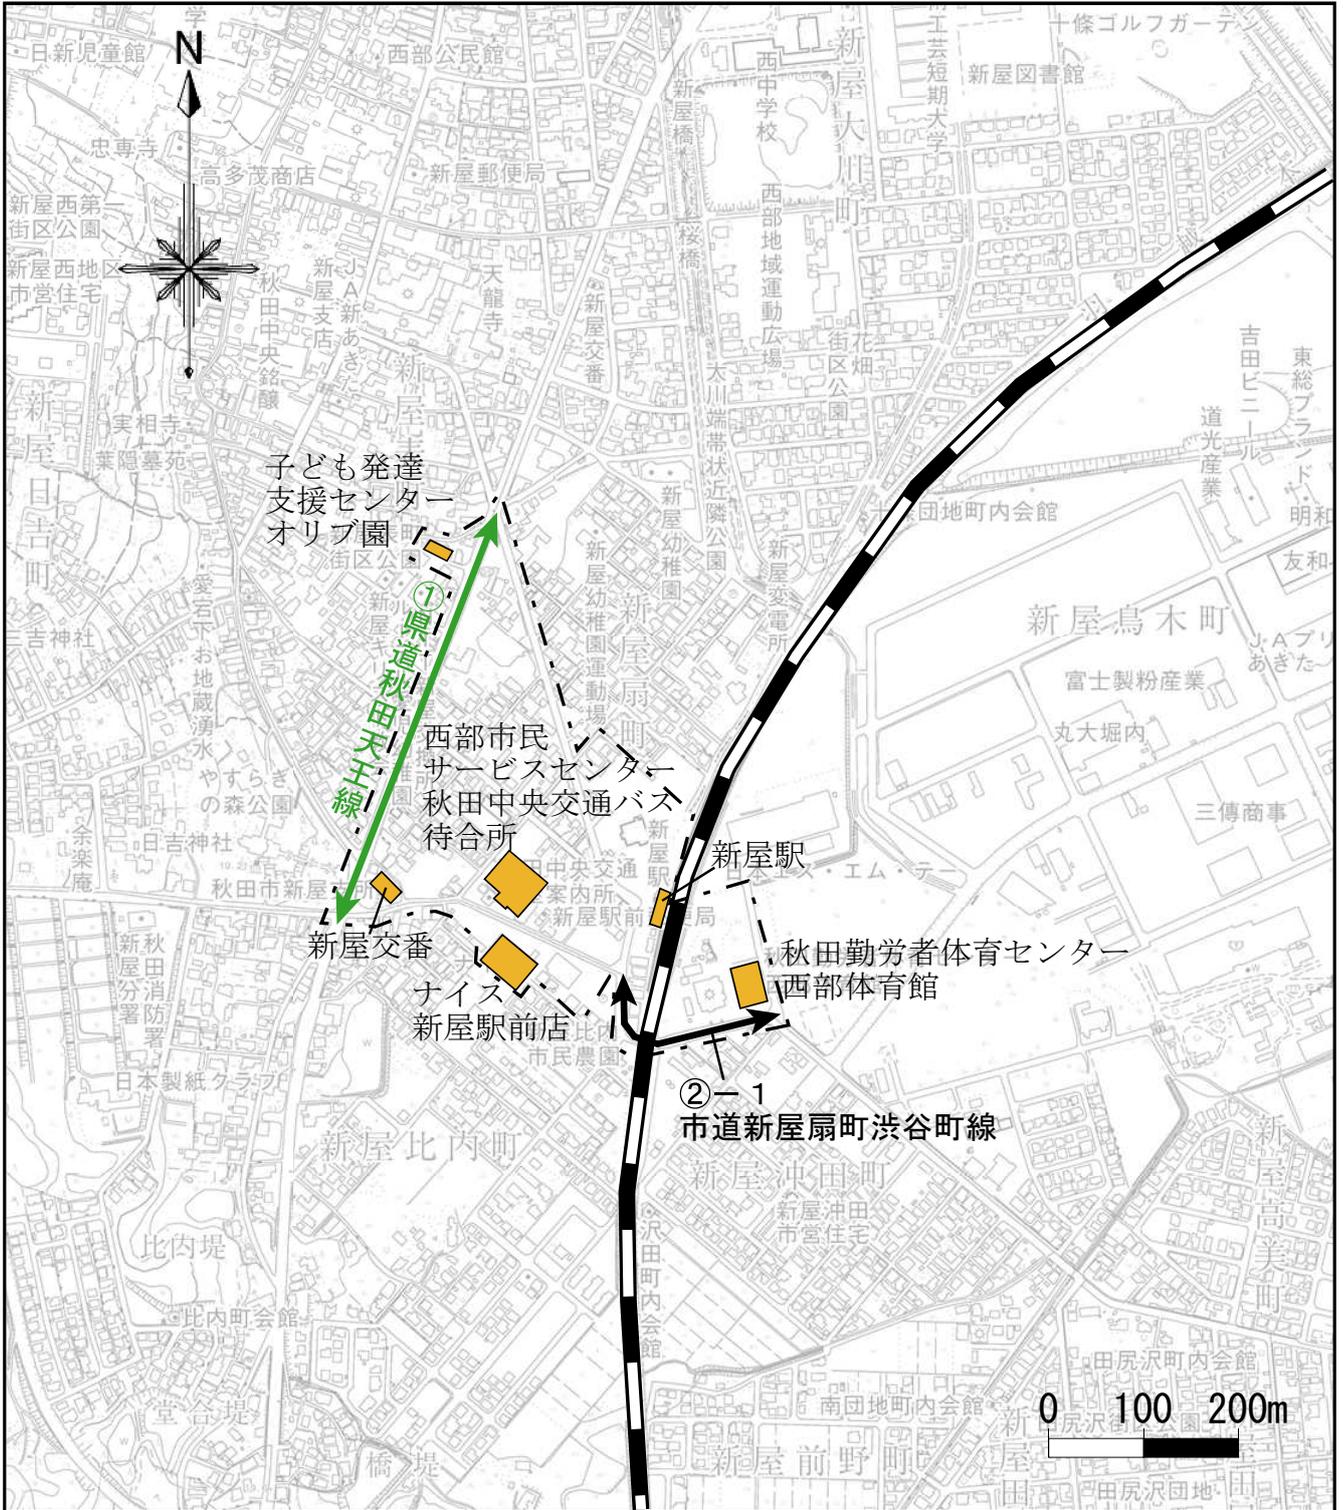

凡 例		重点整備地区	
	平成 26 年度 完 成		継 続 中
	平成 25 年度 以 前 完 成		未 着 手

# 特定事業の進捗状況【市立病院・山王官公庁周辺地区】

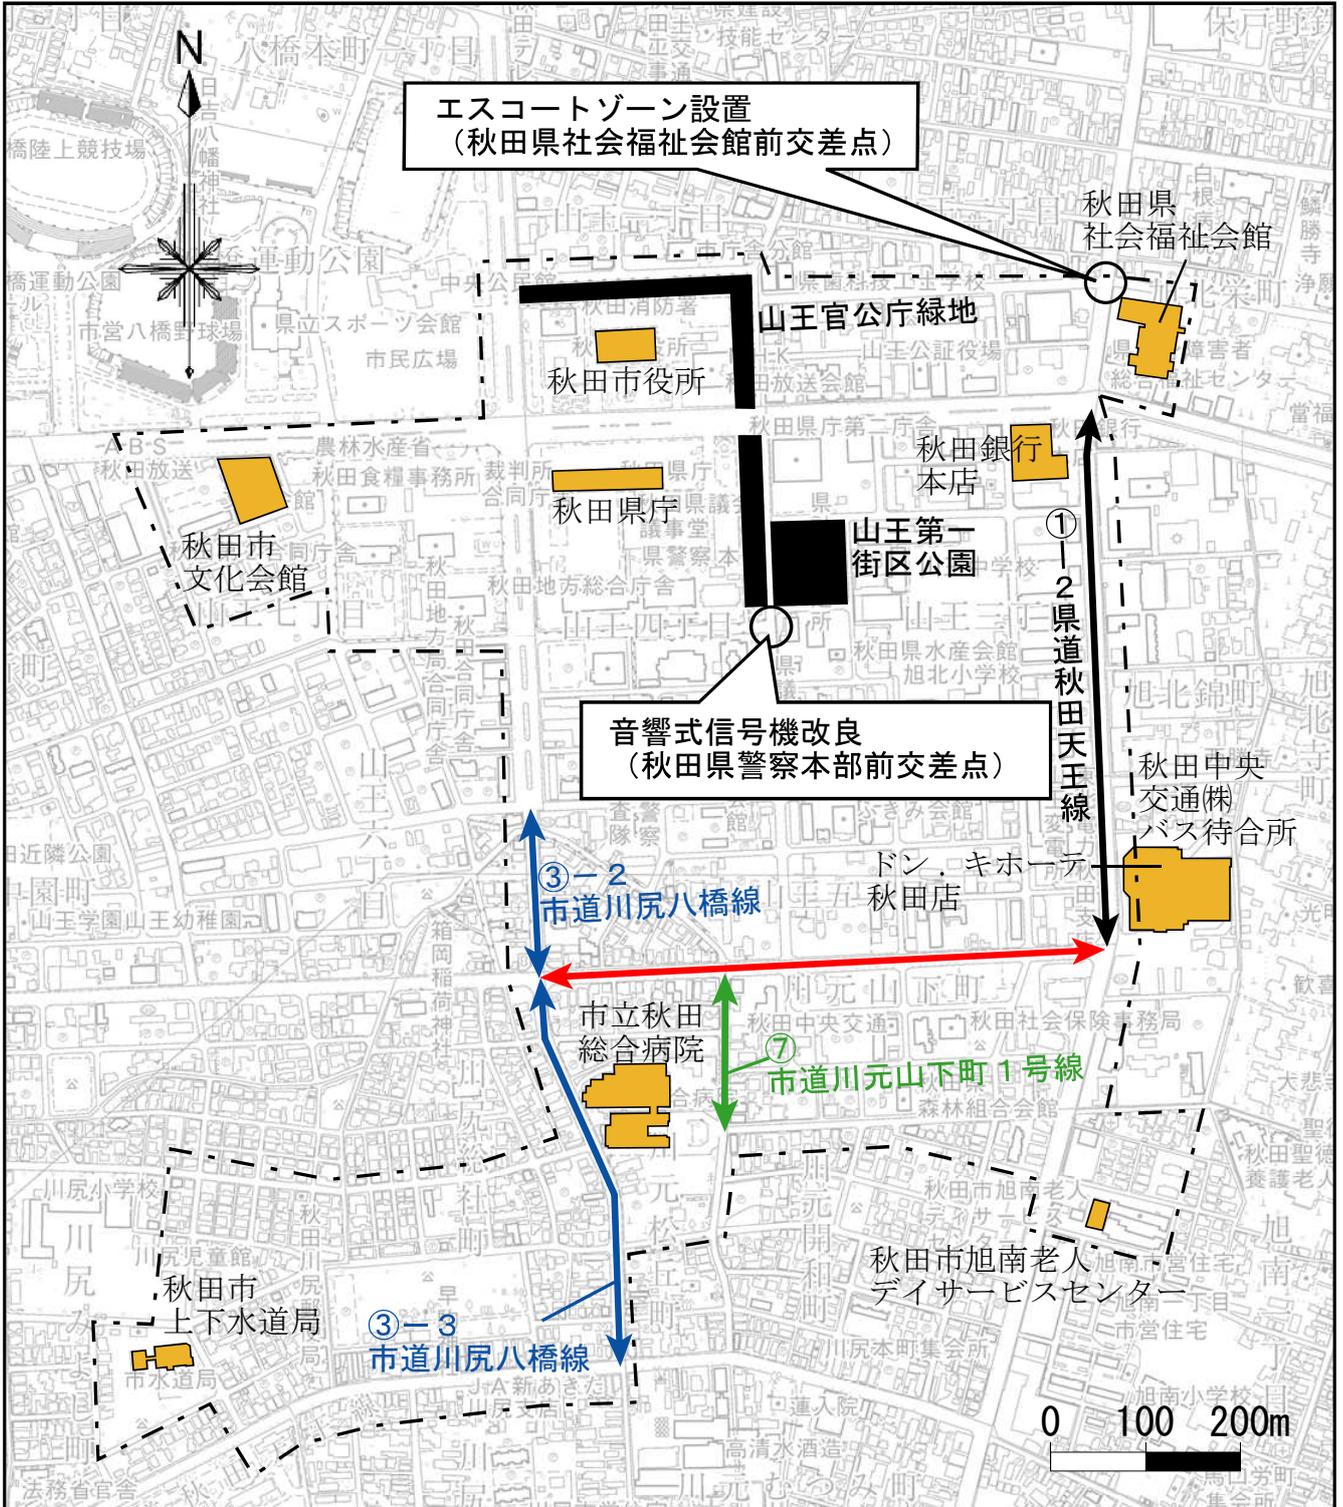

凡 例		重点整備地区	
	平成 26 年度 完成		継続中
	平成 25 年度 以前 完成		未着手
