


令和7年3月26日(水)午前10時～
千秋公園関係者連絡会第5回会議

千秋公園整備事業について

(令和6年度実績と令和7年度整備予定)



秋田市建設部公園課



千秋公園再整備基本計画
平成30年3月改定

- 社会情勢や市民ニーズ等の変化に対応するため再整備基本計画を改定。
- これまで継承してきた久保田城や千秋公園の歴史と、まちなかで育まれてきた自然環境を活かすとともに、誰もが利用しやすい公園づくりをすることで、市民の憩いの場や、誰もが楽しめるにぎわい空間の形成を目指す。

1 令和6年度整備実績について



1 大手門の堀遊歩道
令和6年7月11日供用開始

2 東側ポケットパーク階段デッキ整備
令和7年3月完成

3 さくら景観整備

令和6年度予算額
92,370千円

1-1 大手門の堀遊歩道

令和6年7月11日供用開始式典



遊歩道からみるハス



遊歩道（昼間）



遊歩道（夜間）



1-2 東側ポケットパーク階段デッキ整備


整備内容・目的

千秋公園東側の入り口となるポケットパークに、植栽部分を改修し、多目的なオープンスペースとして誰もがくつろげる憩いの空間を創出する。


施工前



施工後

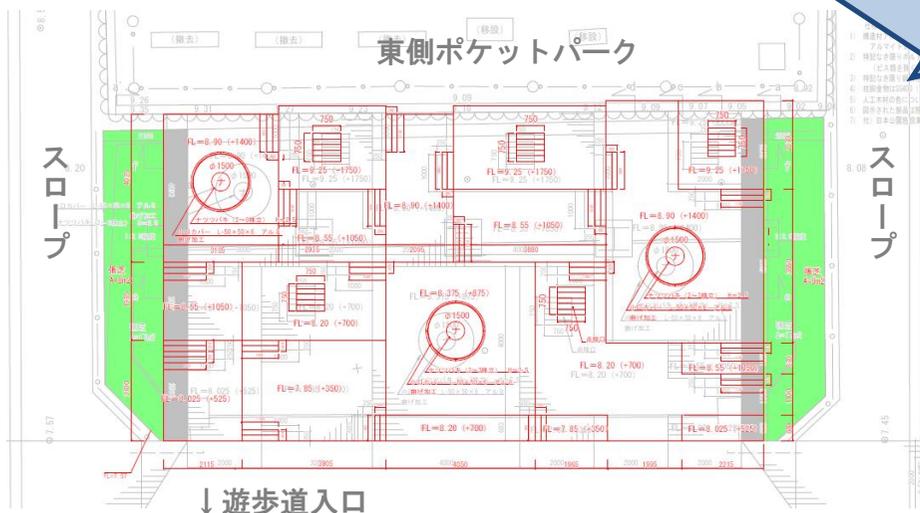

施工後 (夜間)

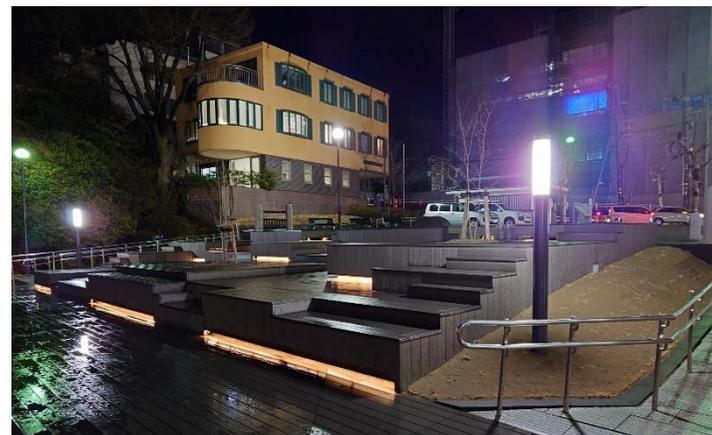

1-3 さくら景観整備

整備内容

- ・ジンダイアケボノ（病害虫に強い）・・・10本
- ・シキザクラ（4月と10月に開花）・・・1本



ジンダイアケボノ



ジンダイアケボノの花→



シキザクラの花→



2 令和7年度整備予定について



① 駐車場整備 調査・設計
令和7年3月契約済～
令和7年7月完成予定

② さくら景観整備

③ 堀植生管理業務

令和7年度予算額

30,227千円

2-1 駐車場整備 調査・設計

整備内容・目的


児童遊園地に、ニーズの高い駐車場を整備するための調査・設計を実施する。



2-2 さくら景観整備

整備内容・目的

本丸エリアに、ジンダイアケボノを植栽（更新）する。




老齢木が過密な状況→若木が適正間隔で植栽された環境へ

2-3 堀植生管理業務

整備内容・目的

大手門の堀内に生育が拡大しているマコモを根茎ごと除去する。

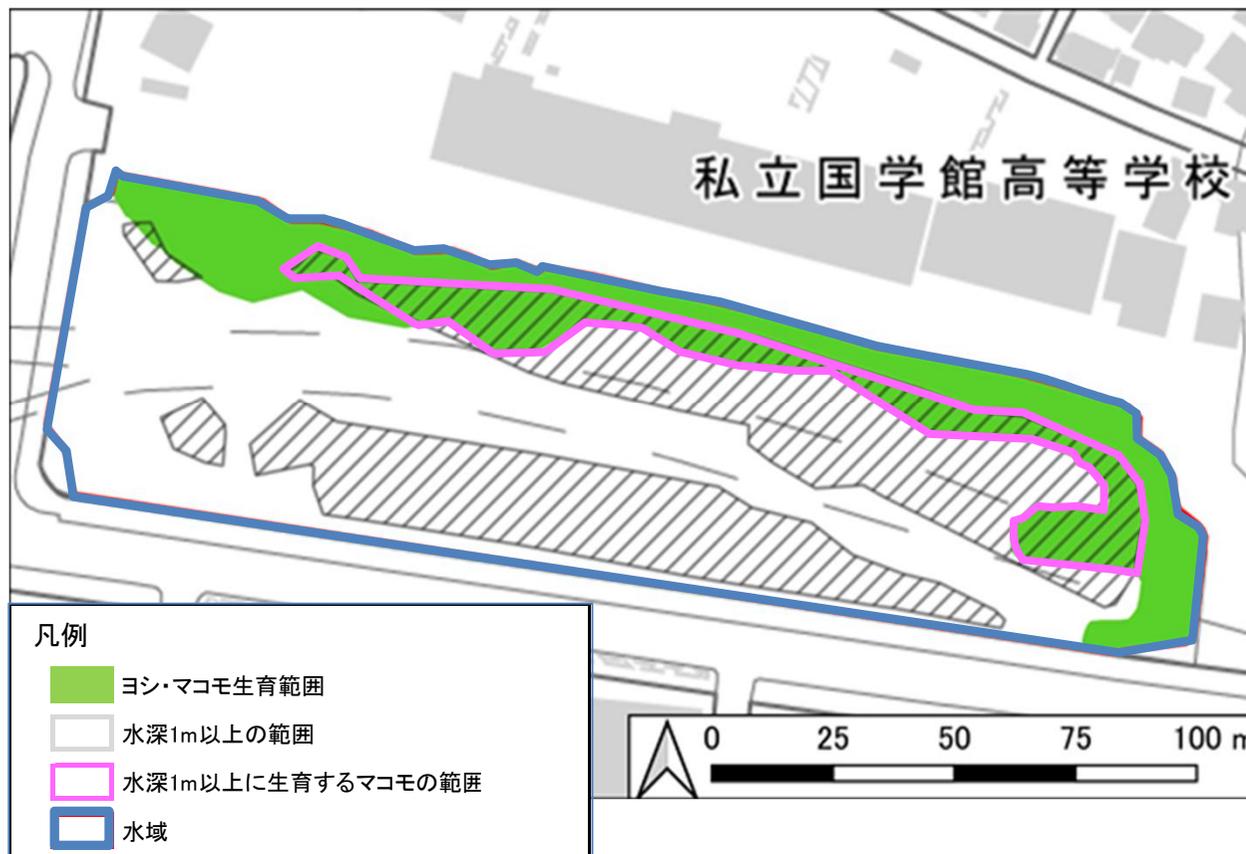

マコモ繁茂状況写真

