



古川雨水排水ポンプ場工事だより

発注者：秋田市上下水道局 担当：下水道整備課 下水道整備第二係 018-864-1455

令和7年7月号



各工事の進捗状況 及び お知らせ

建設工事：引込施設・ポンプ場（基礎・躯体）・吐出水槽・乗り越し管
熊谷・山岡・秋田舗道建設工事共同企業体
工期：令和6年1月29日～令和8年3月23日

連絡先：現場代理人 鈴木 駿


事務所：018-838-5493

乗り越し管
管の設置状況

ポンプ場
底版鉄筋の組立




ポンプ場から汲上げた水はこの管を通して雄物川へ排出します。

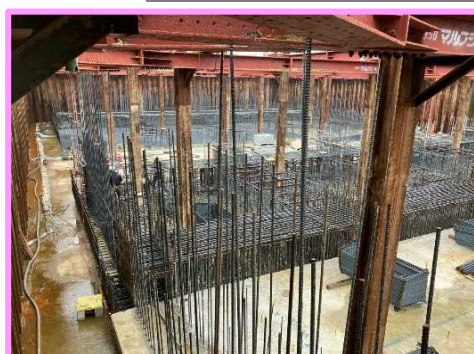

コメント

ポンプ場は、下段側切梁の取り外しが完了し、施工スペースが広がった分、作業人員を増員して躯体工事に取り掛かっています。今月はポンプ場で2回、引込施設で1回、大規模コンクリート工事を実施予定です。詳細な日時はポンプ場入り口前の電光掲示板でお知らせいたします。引き続き生コン車や資機材運搬車両の出入りにより、ご迷惑をおかけしますがご理解、ご協力いただきますようお願いいたします。

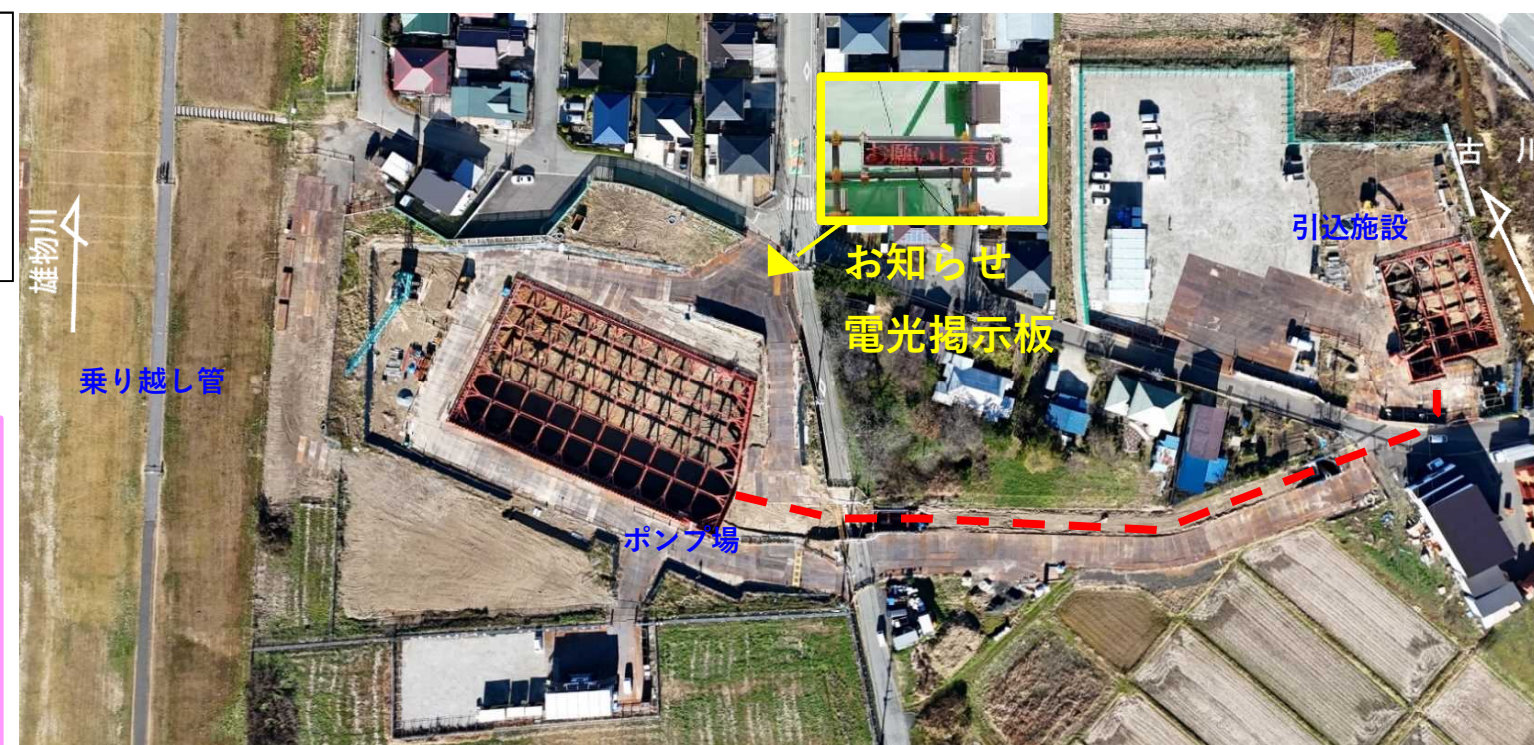

引込施設
地下壁部
鉄筋・型枠組立



裏面につづく

公共下水道築造工事：導水渠

山岡・加賀屋・石黒建設特定建設工事共同企業体

工期：令和6年1月12日～令和7年8月22日

連絡先：現場代理人 高橋 浩樹

事務所：018-826-1616



コメント

工事は一時中止となっておりますが現場には常駐しております。

ご不明な点などありましたら連絡をお願いします。

※工事再開時には改めてPRを行います。



護岸工事：護岸整備工事

伊藤工業 株式会社

工期：令和7年4月1日～令和8年3月19日

連絡先：現場代理人 大友 朝陽

事務所：018-886-2135



コメント

施工開始予定は9月からの予定です。

ご不明な点がありましたら連絡をお願いします。



機械設備工事：

西島・山岡・秋田東北建設工事共同企業体

工期：令和6年3月18日～令和8年3月23日

連絡先：現場代理人 菊池 圭紘

事務所：022-223-3971

コメント

現在、設備機器の製作を進めております。

なお、現場の作業は、建設工事と工程を


調整しながらの実施を予定しております。

機器紹介



【吐出弁（イメージ図）】

吐出槽からの雨水逆流を防ぐ為に、主
ポンプ吐出管に8台設置します。



電気設備工事：

本荘電気・松澤電気・ライトン特定建設工事共同企業体

工期：令和6年6月7日～令和8年3月23日

連絡先：現場代理人 渡邊 淳

事務所：018-823-7281

コメント

現在、設備機器の製作を進めております。

なお、現場の作業は、建設工事と工程を

調整しながらの実施を予定しております。



機器紹介



【ガスタービンエンジン（イメージ図）】

主ポンプ運転用発電装置に搭載されるガスタービンエンジンです。燃料を大量の空気で燃焼させますので、ディーゼルエンジンに比べ、窒素酸化物（NOX）や一酸化炭素（CO）も少なくよりクリーンな排気になります。
