


令和5年3月23日（木）
第3回千秋公園関係者連絡会

千秋公園整備事業について

（令和4年度実績と令和5年度予定）

秋田市建設部公園課

千秋公園再整備事業について




千秋公園再整備基本計画に基づき、これまで継承してきた千秋公園の歴史と、まちの中で育まれてきた自然環境を活かすとともに、誰もが利用しやすい公園づくりを目指し、千秋公園の再整備を行う。

千秋公園再整備基本計画

平成30年3月改定

1 令和4年度整備実績について

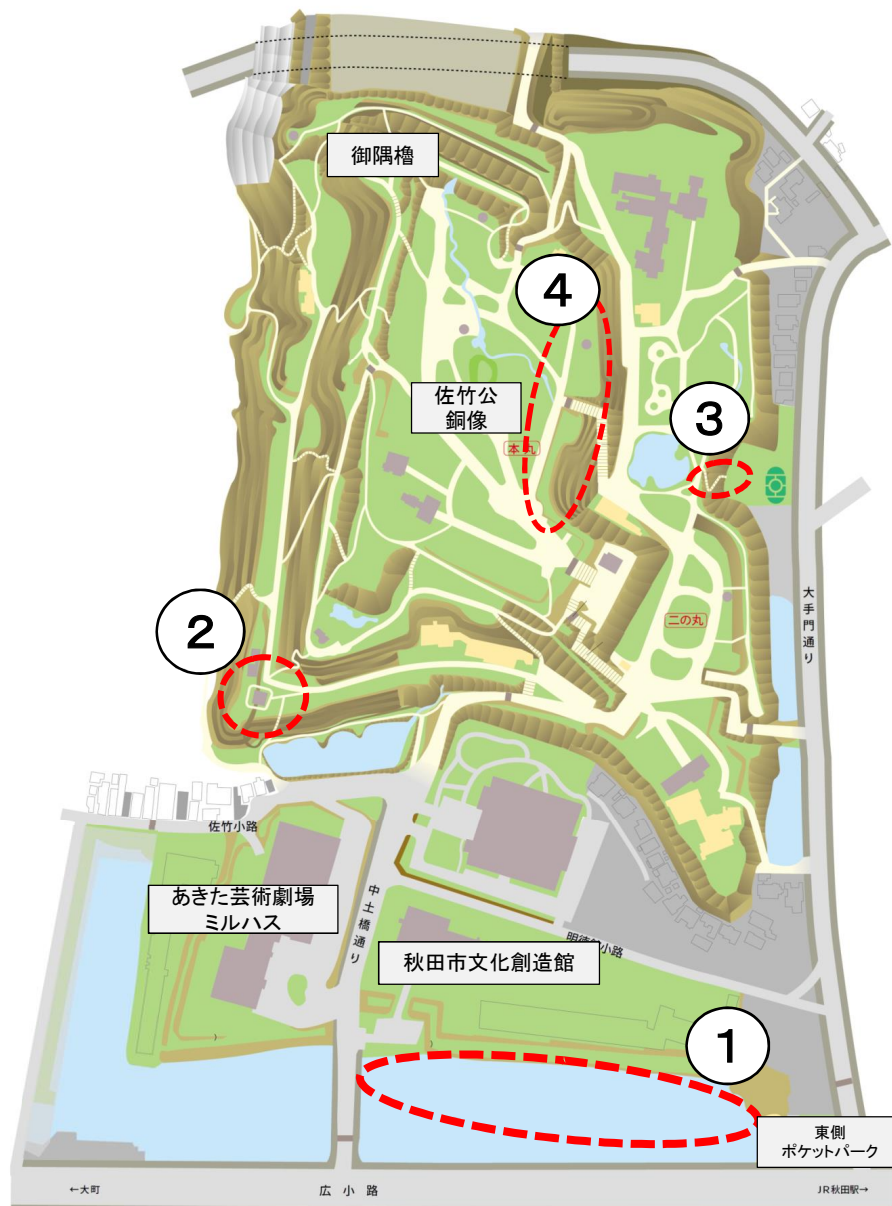

1 大手門の堀遊歩道整備
※設計委託

2 鐘楼更新整備
※設計委託

3 市民交流ゾーン園路整備
(旧脳研向かいの階段)

4 さくら景観整備

5 民間活力による収益施設の
導入検討

令和4年度予算額

195,200千円

3- 1 . 大手門の堀遊歩道整備

1 目的・整備内容

大手門の堀内に東側ポケットパークから中土橋跡側へとつながる遊歩道を整備する。令和4年度は詳細設計を実施した。

大手門の堀（8月）



（参考）整備事例



整備スケジュール

令和3年度	基本計画策定
令和4年度	詳細設計完了
令和5年度	工事着手 整備完了

3-2. 鐘楼更新整備

目的・整備内容

老朽化した鐘楼を改修するため、現地調査および詳細設計を実施した。

施設現況




位置図



整備スケジュール

令和4年度 現地調査、詳細設計完了

令和5年度 着工・整備完了

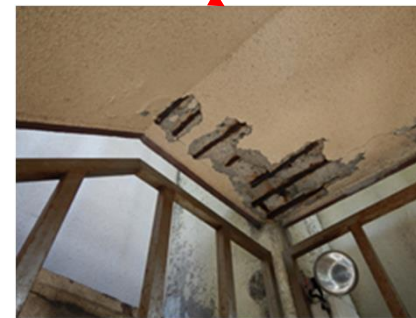

3-3. 市民交流ゾーン園路整備工事（階段）

目的・整備内容

市民交流ゾーン（二の丸市民広場付近）までの利用動線を強化するとともに、**ユニバーサルデザインに配慮**した整備を実施した。


施工前



施工後



位置図

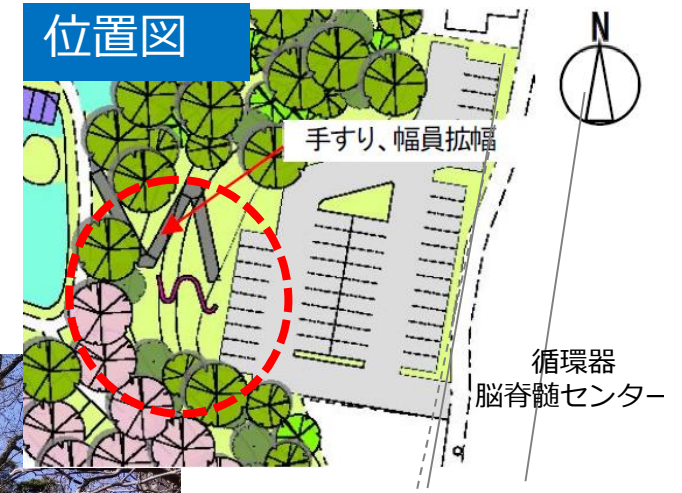

3-4. さくら景観整備

目的・整備内容

- ・ さくらファンドを利用し、本丸の桜の植え替えを実施した。
- ・ 良質土に入替え、病気に強い品種「**ジンダイアケボノ**」を11本植栽。
- ・ ワークショップを開催し、**施肥**作業を行った。



老齢木が過密な状況から、若い木が適正な間隔で植栽された環境へ



ワークショップの様子

3-5.民間活力による収益施設の導入検討


目的・整備内容

- ・公園内に新規整備を計画している有料駐車場について、**官民連携手法により整備**できないか検討を進めている。
- ・駐車場の整備内容や管理運営手法等について民間事業者から広く意見を聴く、マーケットサウンディング調査（対話型市場調査）を実施した。

施設現況




位置図

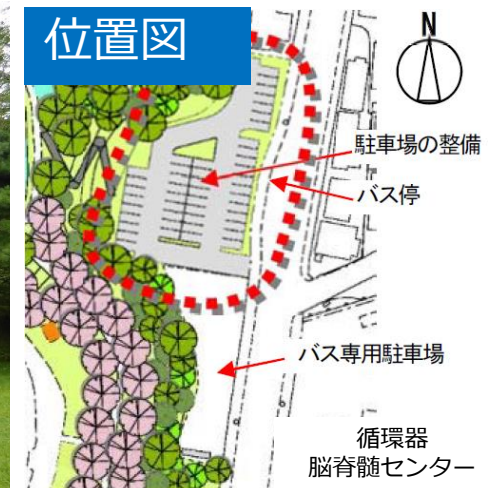

事業スケジュール

- | | |
|-------|-------------------------|
| 令和4年度 | 駐車場整備に関するマーケットサウンディング調査 |
| 令和5年度 | 整備条件等の再調査 |

2 令和5年度整備予定について

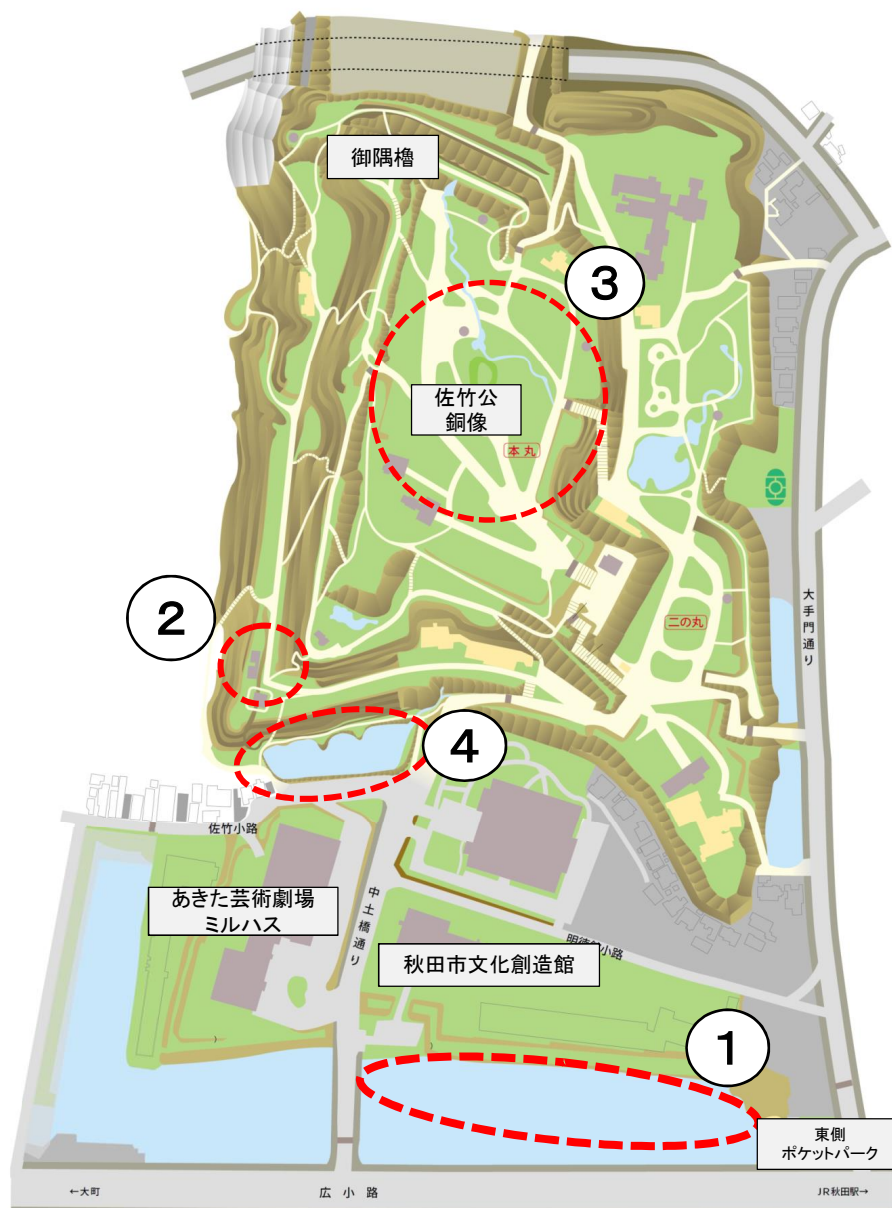

1 大手門の堀遊歩道
整備工事

2 鐘楼更新整備

3 さくら景観整備

4 内堀の水質浄化


5 民間活力による収益施設の
導入検討

令和5年度当初予算額

325,360千円

2-1. 大手門の堀遊歩道整備

平面図

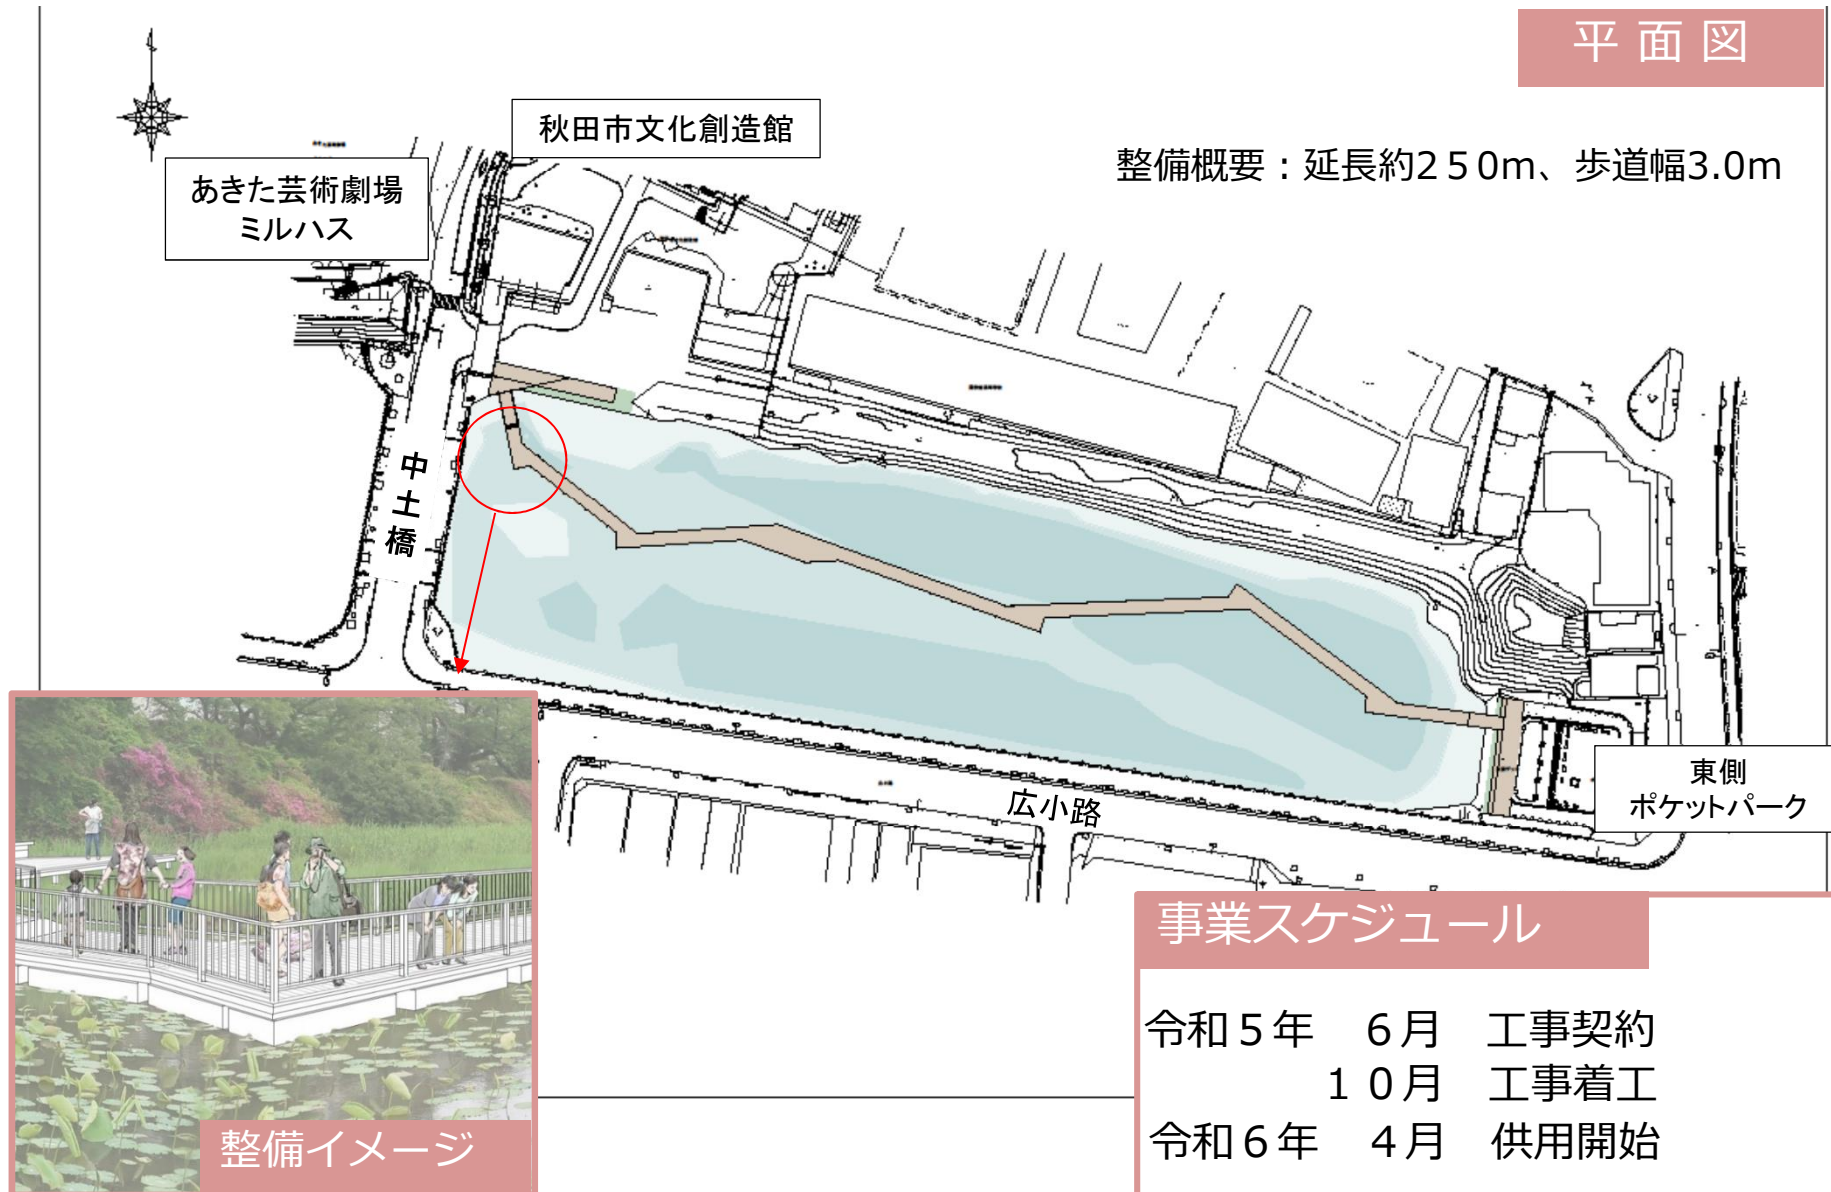

2-2. 鐘楼更新工事

目的・整備内容

令和4年度に完了した詳細設計をもとに、改築工事を実施する。

現在の鐘楼



2-3. さくら景観整備

目的・整備内容

- ・ さくらファンドを利用し、本丸エリアの桜の植え替えを実施予定。これに伴い、支障木等の伐採も実施する。
- ・ 病気に強い品種「**ジンダイアケボノ**」の植栽を予定。



整備イメージ

2-4. 内堀水質浄化

目的・整備内容

汚泥等の処理を行うことで、内堀の水質改善を図る

内堀現況



2-5. 民間活力の導入検討

目的・整備内容

- ・ 有料駐車場整備に向けた検討を実施する
- ・ 既存施設（旧香雲亭）の利活用に向けた公募を実施する

施設現況

