

令和6年3月22日（金）


千秋公園関係者連絡会第4回会議

千秋公園整備事業について

（令和5年度実績と令和6年度整備予定）

秋田市建設部公園課


千秋公園再整備事業について



千秋公園再整備基本計画に基づき、これまで継承してきた千秋公園の歴史と、まちの中で育まれてきた自然環境を活かすとともに、誰もが利用しやすい公園づくりを目指し、千秋公園の再整備を行う。

千秋公園再整備基本計画
平成30年3月改定

1 令和5年度整備実績について

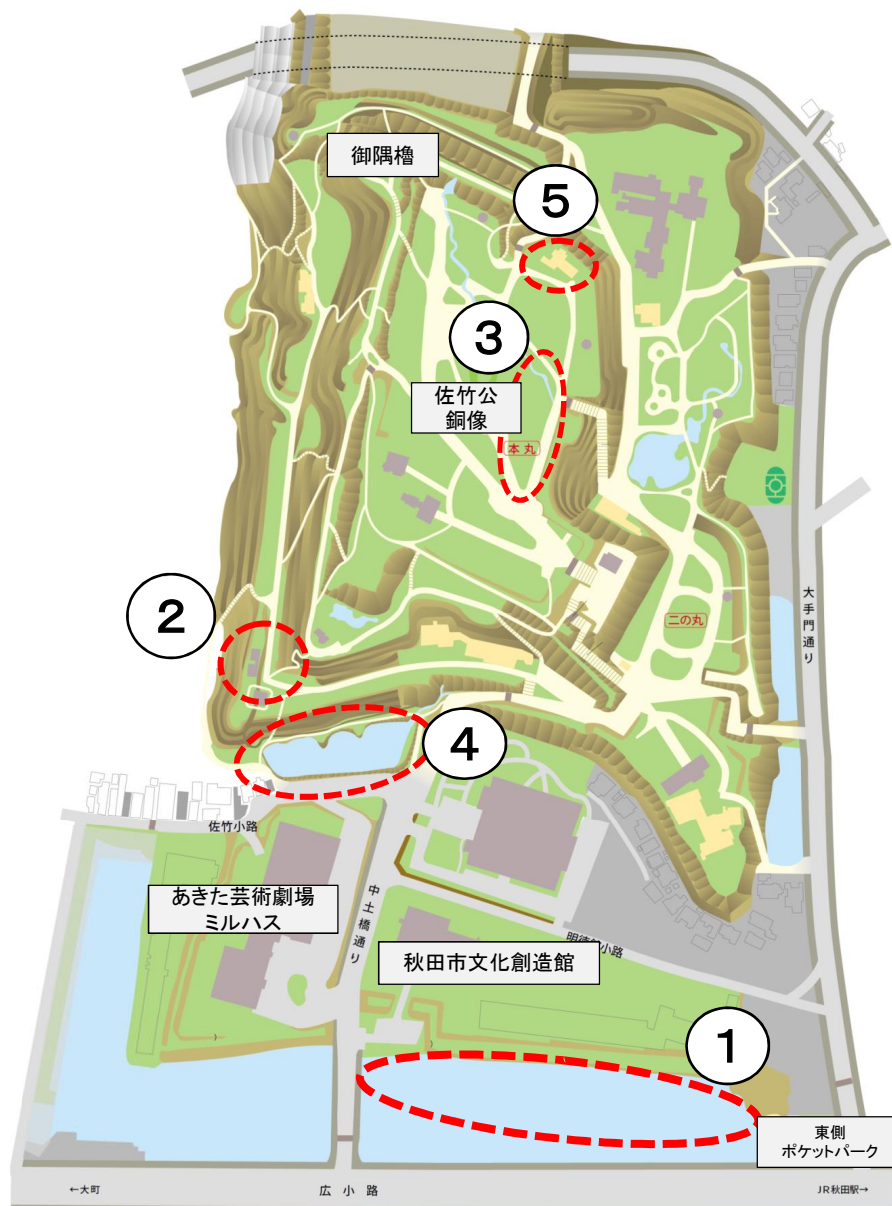

1 大手門の堀遊歩道整備

2 鐘楼更新整備

3 さくら景観整備

4 内堀の水質浄化

5 民間活力による収益施設の導入検討

令和5年度予算額

325,360千円

1-1. 大手門の堀遊歩道整備

目的・整備内容

大手門の堀内に東側ポケットパークから秋田市文化創造館の芝生広場へとつながる遊歩道を整備した。

整備概要：延長約250m、歩道幅3.0m

現況写真
ミルハス4階から

← 秋田市文化創造館



1 - 2 . 鐘楼更新整備

目的・整備内容

令和4年度に実施した詳細設計をもとに、改築工事を実施した。

改築後の鐘楼



位置図



鐘



1-3. さくら景観整備

整備内容

- ・病気に強い品種「ジンダイアケボノ」を11本新たに植樹した



※ワークショップでの
施肥体験の様子

1-4. 内堀水質浄化

整備内容

汚泥等の処理を行うことで、内堀の水質改善を図る

内堀現況



1-5. 民間活力の導入検討

目的・整備内容

既存施設（旧香雲亭）の利活用が可能か、公募による事業者からの対話形式の調査を行った。

施設現況



旧香雲亭


調査結果

○対話調査への参加事業者 1 者

○おもなアイデア

- ・ 記念館等の設置による魅力向上
- ・ 学生食堂やオープンカフェの併設
- ・ 各種イベントでの活用

2 令和6年度整備予定について

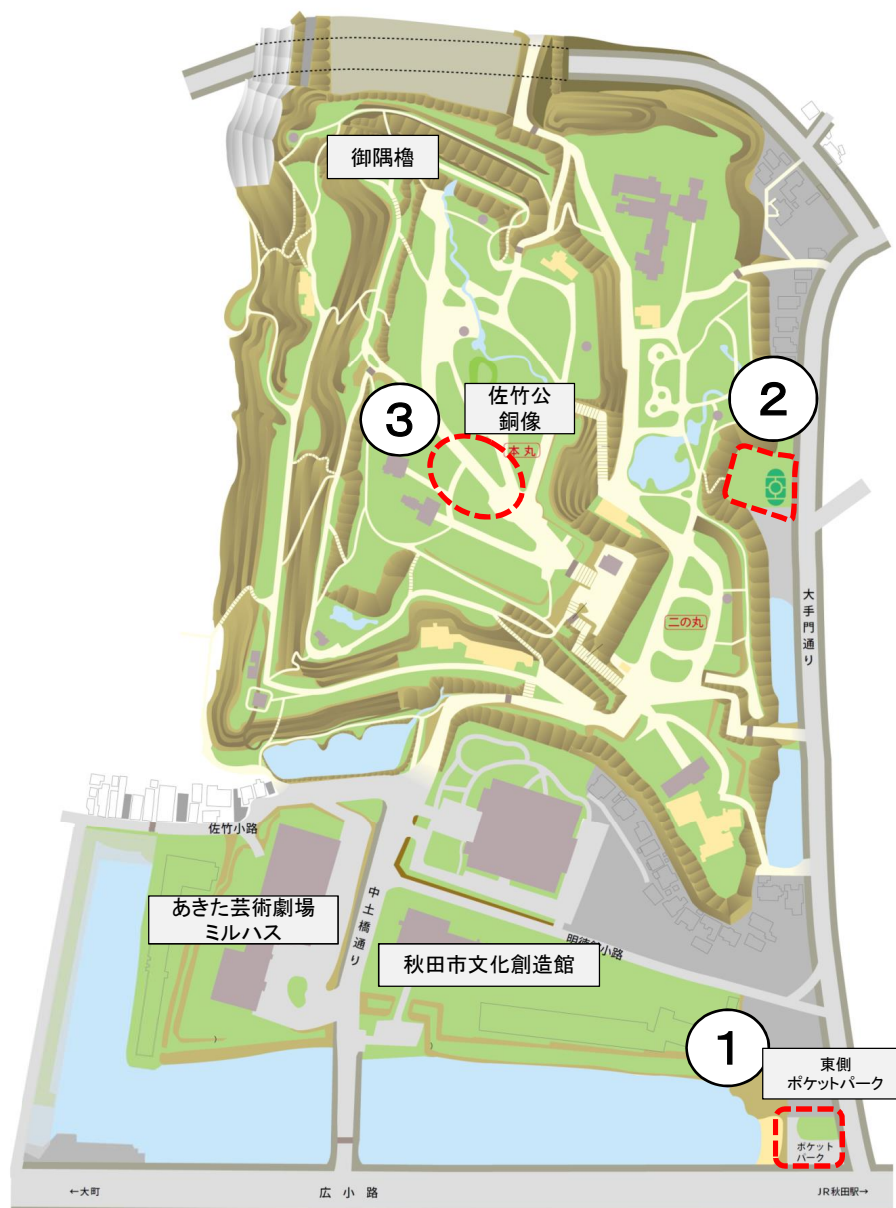

1 東側ポケットパーク
改修（階段デッキ）

2 駐車場整備
（調査・設計）

3 さくら景観整備

※ 大手門の堀遊歩道整備
（付帯工事）

令和6年度予算額

92,370千円

2-1. 東側ポケットパーク改修（階段デッキ）

目的・整備内容

千秋公園東側の入り口となるポケットパークに、植栽部分を改修し、多目的なオープンスペースとして誰もがくつろげる憩いの空間を創出する。



※整備イメージ

2-2. 駐車場整備（調査・設計）


目的・整備内容

秋田県立循環器・脳脊髄センター前の児童遊園地について、駐車場として整備するための調査・設計を実施する。

施設現況



位置図

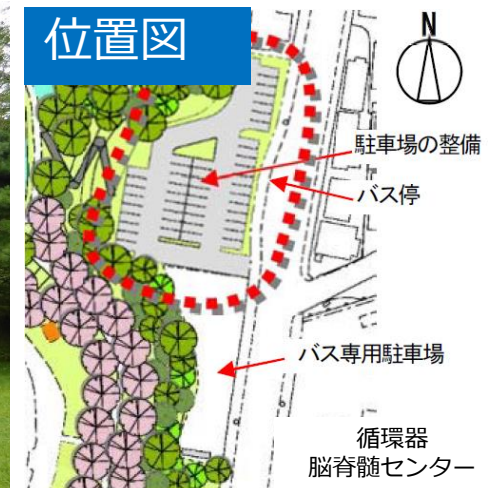

事業スケジュール

令和6年度 駐車場整備のための調査・設計

令和7年度 駐車場整備工事（予定）

2-3. さくら景観整備

目的・整備内容

- ・ さくらファンドを利用し、良質土に入替え、病気に強い品種「ジンダイアケボノ」等を植栽する
- ・ 本丸エリアの環境整備を進めていく。



老齢木が過密な状況から、若い木が適正な間隔で植栽された環境へ

※ 大手門の堀遊歩道整備 付帯工事について

おもな整備内容

- ・案内板等の設置
- ・手すり防護カバーの設置



供用開始イメージ

○大手門の堀遊歩道の運用方針について

(1) 車両等の通行

ハスの観賞を利用者が安心して楽しめるよう、車両等は通行禁止とする。

(2) 夜間照明

照明（フットライト）の点灯時間は日没後から原則午後 10 時までとする。

(3) 冬期利用

12 月から 3 月までは基本的に通行止めとし、柵等で出入口を閉鎖する。

(4) イベント等による利活用

イベント等による中心市街地のさらなる活性化に繋がるよう、夜間照明の時間および冬期利用の制限については、イベント事業者等と協議のうえ適宜対応する。
